



# FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM

5. maj 2015

IT-faggruppen

**KOMB!T**

Kommunernes it-fællesskab

# Dagsorden

1. Scope og historik
2. Udvikling
  1. Løsningen
  2. Integrationer
3. Udrulning
  1. Konvertering
  2. Fra fælles projekt til lokale projekt
  3. Lokale projekter
4. Fællesskabet
5. Spørgsmål

# 1. Scope og historik

- Modernisering
  - Nemmere vedligehold
  - Bedre integrationer
- Synergi af folkebibliotek og læringscenter fællesskabet
- Integration til Danskernes Digitale Bibliotek
- Styrket ejerskab til løsning og data
- Historik
  - Kravarbejdet 2012
  - Udbud og kontrakt 2013
  - Udvikling 2014/2015
  - Udrulning 2015/2016
- Alle danske kommuner på nær 5-6 + Sydslesvig

# 1. Projektets styring / bemanning

- **Styregruppe**

Peter Egelund, CIO, KOMBIT ; Helle Kolind Mikkelsen, Chefkonsulent, KL's Kontor for Børn og Kultur ; Bo Fristed, IT-chef i Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune ; Flemming Olsen, Direktør, Herlev Kommune (repr. for Børne og Kulturchefforeningen) ; Anders Lou, Kommunaldirektør Brøndby Kommune (repr. for Kommunaldirektørforeningen) ; Glenn Lervaad-Bjørn, Sekretariatsleder, Danskernes Digitale Bibliotek (observatør) ; Niels Højer-Pedersen, KOMBITs projektleder ; Per Kjær, Bibliotekernes projektleder

- **Organisationsfølgegruppe**

Morten Fogh, Aabenraa Kommune ; Bodil Have, Aalborg Kommune ; Annette Brøchner Lindgaard, Esbjerg Kommune ; Betty Nygård, Fredericia Kommune ; Marianne Olsen, Greve Kommune ; Pernille Saul, Guldborgsund Kommune ; Pia Schack Pedersen, Københavns Kommune ; Mogens Vestergaard , Roskilde Kommune ; Camilla Johansen, Kolding Kommune ; Inger Surrow, Aarhus Kommune

- **Advisory board**

Dorte L. Børresen, Horsens Kommune ; René Høtbjerg Øhlenschläger, Københavns Kommune ; Kirsten Fisker, Kolding Kommune ; Peter Høgsberg, Holstebro Kommune ; Lilli Mortensen, Vejle Kommune, repræsentant for CB ; Bente Skøtt Christiansen, Aabenraa Kommune ; Lone Thomsen, Randers Kommune ; Anton Helms, Odense Kommune ; Thomas Angermann, Gentofte Kommune

## 2. Udvikling - Løsningen

- **0.9.1 - november 2014**
  - Søgning og visning af bibliografiske poster(hos DBC) ; Udlån ; Fornyelse ; Reservation ; Aflevering ; Find/Opret låner
- **0.9.2 - januar 2015**
  - Bruger indlogging ; Udvidet funktionalitet basisfunktionerne - udlån, fornyelse, reservation, aflevering ; Accession - herunder integration til Open Cat ; Lister - pickup lists ; Administration - lånere, leverandører, opstillinger m.m. ; Spec's for diverse integrationer (DDB CMS, SIP2 m.m.
- **0.9.3 - april 2015**
  - API til DDB CMS ; Flere funktioner under accession og beholdning ; Booking ; Prisforspørgsel ; Betaling af mellemværende ; Brugeradministration ; Skoleportal ; SIP2 ; NCIP
- **1.0 - juni 2015**
  - Fjernlån ; Tidsskrift- og periodikahåndtering ; Fejlrettelser i forhold til version 0.9.3
- **1.1 - september/oktober 2015**
  - Biblioteket kommer ; Intelligent materialestyring ; Statistik ; Brugergrænseflade til administrator ; Yderligere integrationer ; Fejlrettelser i forhold til version 1.0



## 2. Udvikling - Integrationer

- DDB CMS
  - DDB CMS kodes af Reload
  - Test af DDB CMS i uge 19 (undtaget tss og fjernlån)
  - 4 release pr. år – første version efter 1.0 kommer ultimo september 2015
- DBC
  - Håndtering af lokale felter
  - Håndtering af valideringsfejl
  - Implementering af ny ILL standard
- 3. partsleverandører
  - CPR, CVR og ØiR via Serviceplatformen – budget ikke med !
  - SIP2
  - EditX

# 3. Udrulning - Konvertering


- DDElibra
  - Dataudtræk (Valideringsfejl ved indlæsning i BRØND)
  - Alle beholdningsposter udtrækkes
  - Lokale felter
  - Forskellige versioner af DDElibra (9.11+9.12)
- BookIT
  - KKB i dialog med Axiell Sverige
- Integra
  - Fjernlån kan ikke konverteres - løsning skal findes !
- Aleph500
  - Udtræk foretaget - dialog med Exlibris
- Dantek
  - Dantek BiblioMatik (Mange valideringsfejl er rettet)
  - Dantek Booking
  - Dantek Materialevalg - konverteres ikke !

# 3. Udrulning - kvartalsbølger

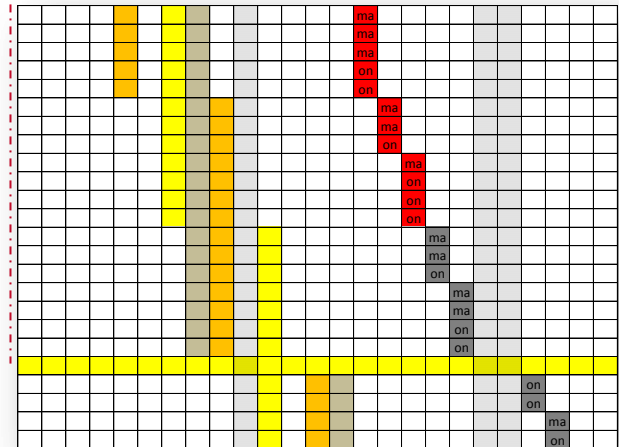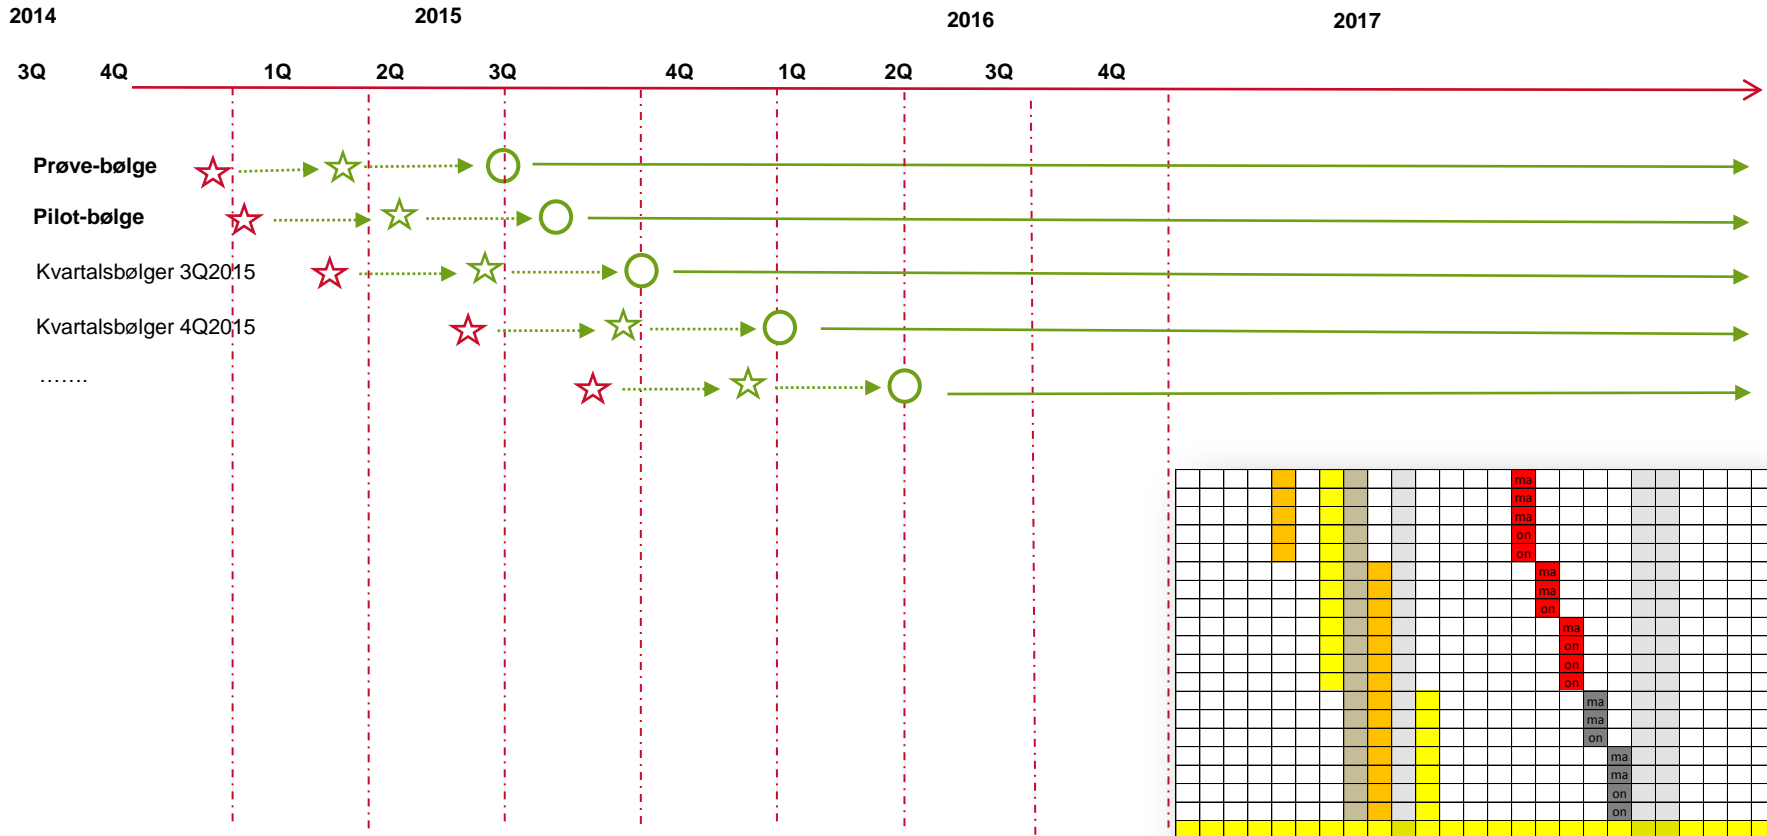




# 3. Udrulning - Lokal forankring

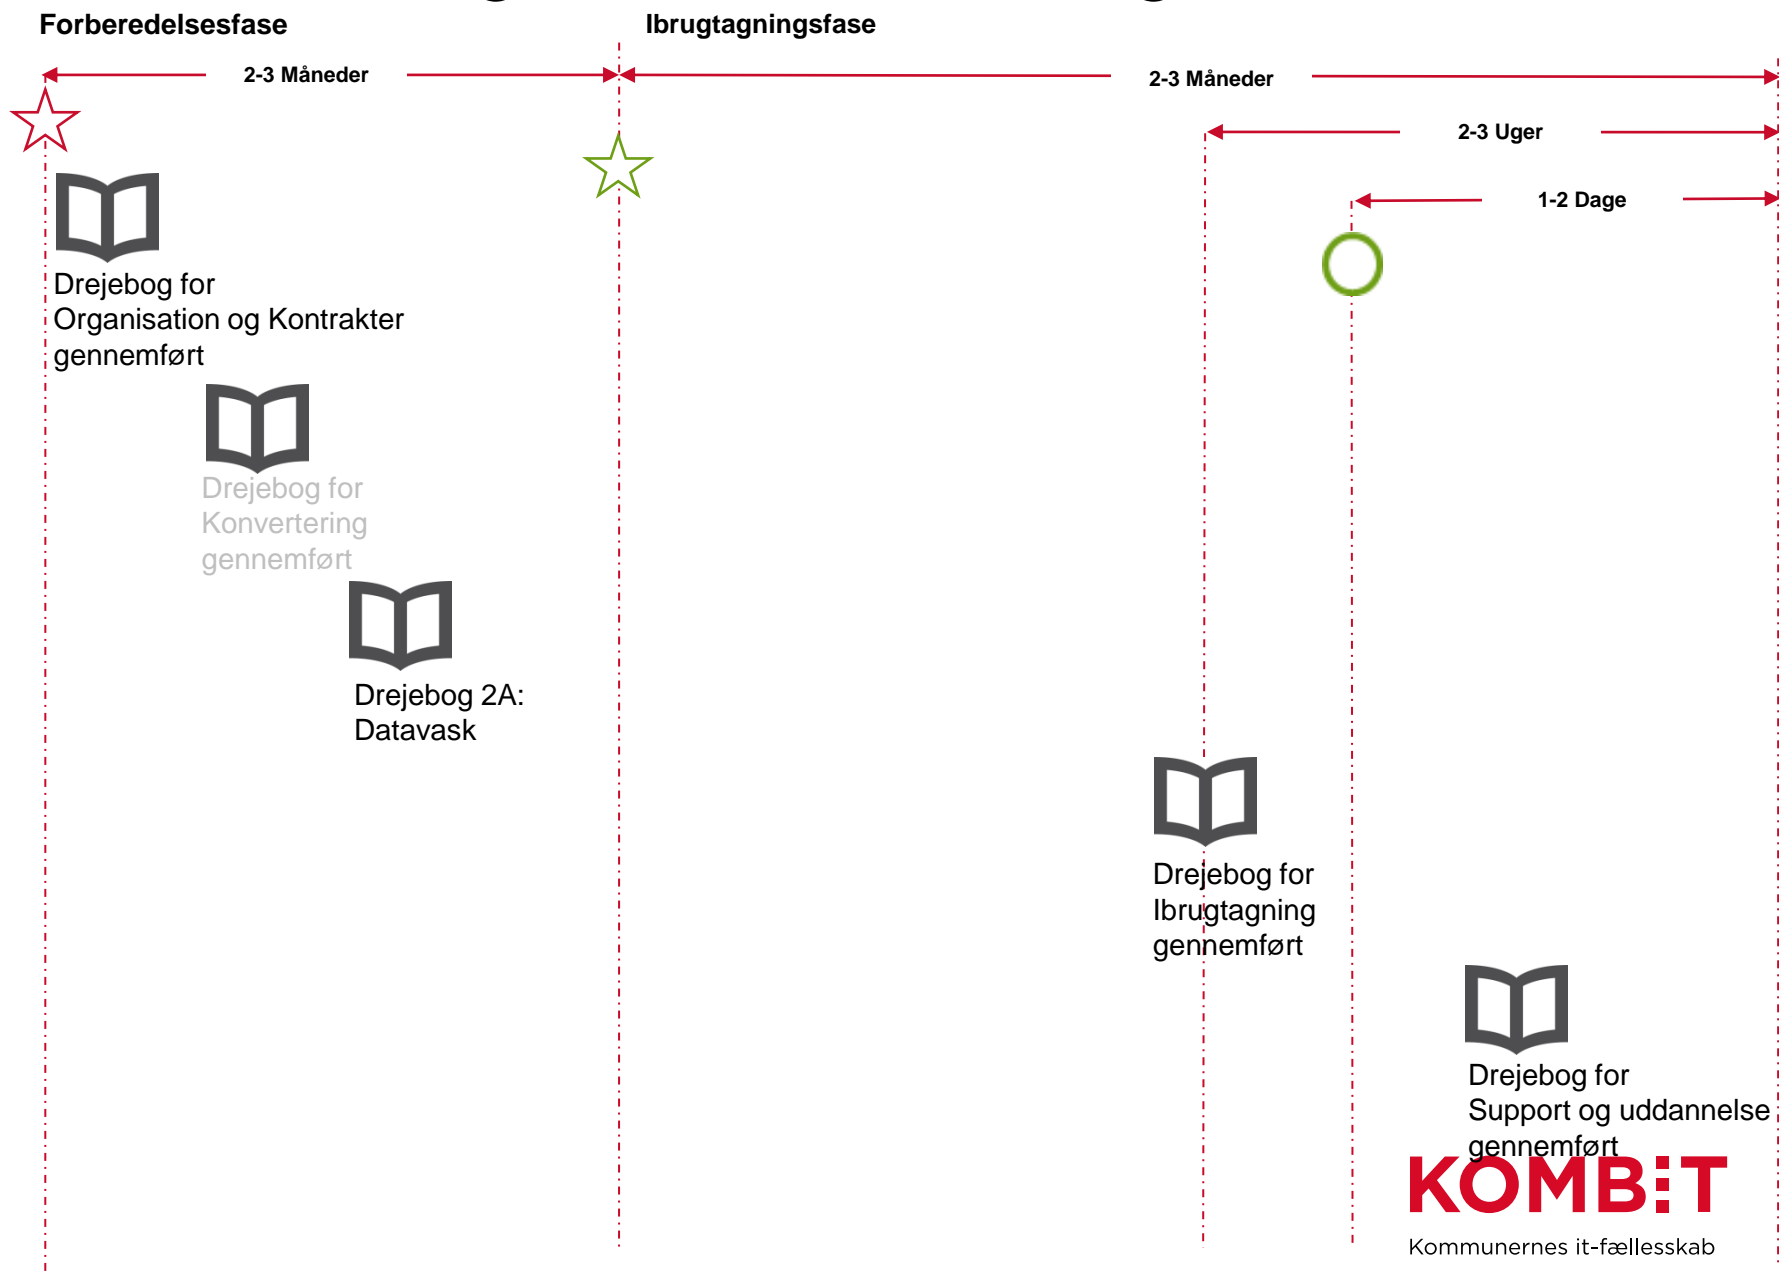

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

# 3. Udrulning - Overordnet lokalt billede

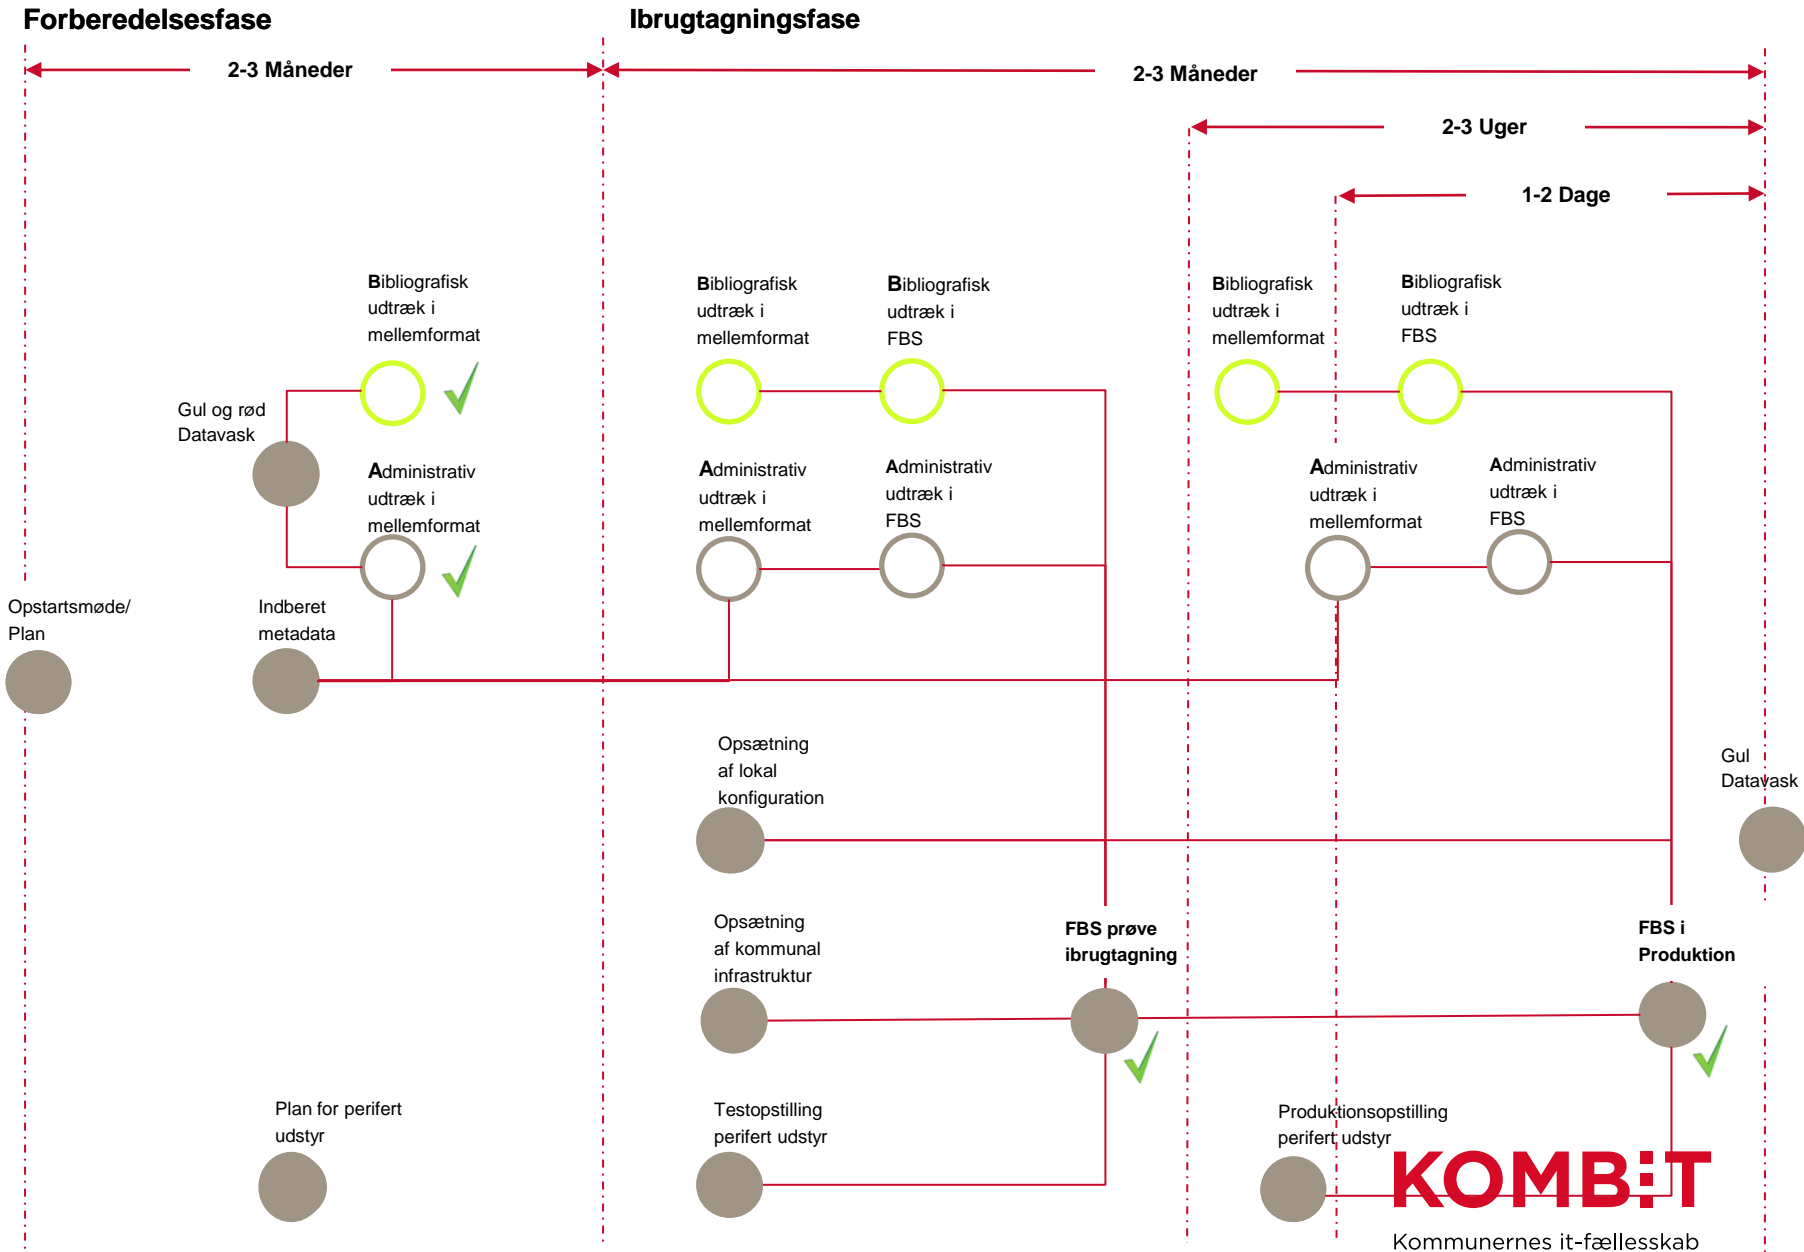

# 3. Udrulning - Lokale projekter

- Kommunerne er GODT I GANG – styr på projektorganiseringen
- Datavask foregår – erfaringer indsamles
- Systemtic har holdt 'Go-live' møder med kommuner der skal på systemet frem til uge 49/2015
- Plan fastlåst til og med uge 49/2015
  - Horsens ; København ; Aabenraa ; Kolding ; Aarhus ; Viborg ; Odsherred ; Sorø m.fl.
- Kommunerne får inden 'Go-live'-mødet adgang til udrulningsportal

## 4. Fællesskabet

- Vedtægter godkendt i Organisationsfølgegruppen
- Udkast til Forretningsorden 1. behandlet
- Revideret udkast sendes i e-høring i Organisationsfølgegruppen og Advisory board
- Institutionsvilkår tæt på godkendelse i Organisationsfølgegruppen
- Valg til Styregruppe for Fællesskabet igangsættes i september 2015
- Styregruppen overtager Fællesskabet når Styregruppe for Udviklingsprojektet nedlægges

# Spørgsmål ?

**KOMB!T**

Kommunernes it-fællesskab
